

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет

Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и дистанционного образования (МРЦПК и ДО)

Кафедра «Экономика и финансы»

Государственная программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ

## **ВЫПУСКНАЯ РАБОТА НА ТЕМУ:**

# **Разработка плана создания электронной платформы для развития проектной деятельности в школах Пензенской области**

Выполнил: Матвеева И.И.

Руководитель: Джазовская И.Н.

г. Пенза 2023 г.

## НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 Г.

---

- ✓ создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека;
- ✓ формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;
- ✓ создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;
- ✓ создание условий для развития наставничества.



### УКАЗ


ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О национальных целях и стратегических задачах развития  
Российской Федерации на период до 2024 года

В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека **п о с т а н о в л я ю:**

1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года:

## Проекты и проектная деятельность



## Результаты

Мероприятия	2020-2021 учебный год	2021-2022 учебный год	2022-2023 учебный год
НПК школьников	27/695	30/655	39/669
НПК педагогов	18/365	10/285	17/268
Олимпиада школьников	1730 чел.	1302 чел.	1649 чел.

# Проект

Внутришкольный  
этап

Защита

Аттестат  
(диплом)

Муниципальный  
этап

Региональный  
этап

Всероссийский  
этап

Что дальше?  
Реализация?

# Нормативно-правовая база



# Образовательные порталы



Наименование портала	Объединяющая характеристика
МЭО	1.Отсутствие банка данных 2. Отсутствует возможность коммерциализации результатов проектной деятельности 3. Отсутствует доступ к архиву проектов для потенциальных заказчиков, инвесторов, заинтересованных пользователей.
Сферум	
Дмип. портал	
Учи.ру	
Яндекс.Учебник	

# Цель и задачи работы




## Цель работы:

Разработка плана создания электронной платформы для развития проектной деятельности в школах Пензенской области

## Задачи работы:


- изучить методические основы управления проектной проектами в сфере цифровизации образования;
- проанализировать опыт создания цифровых платформ для проектной деятельности школьников;
- разработать план создания электронной платформы

# Связь платформы с сервисами

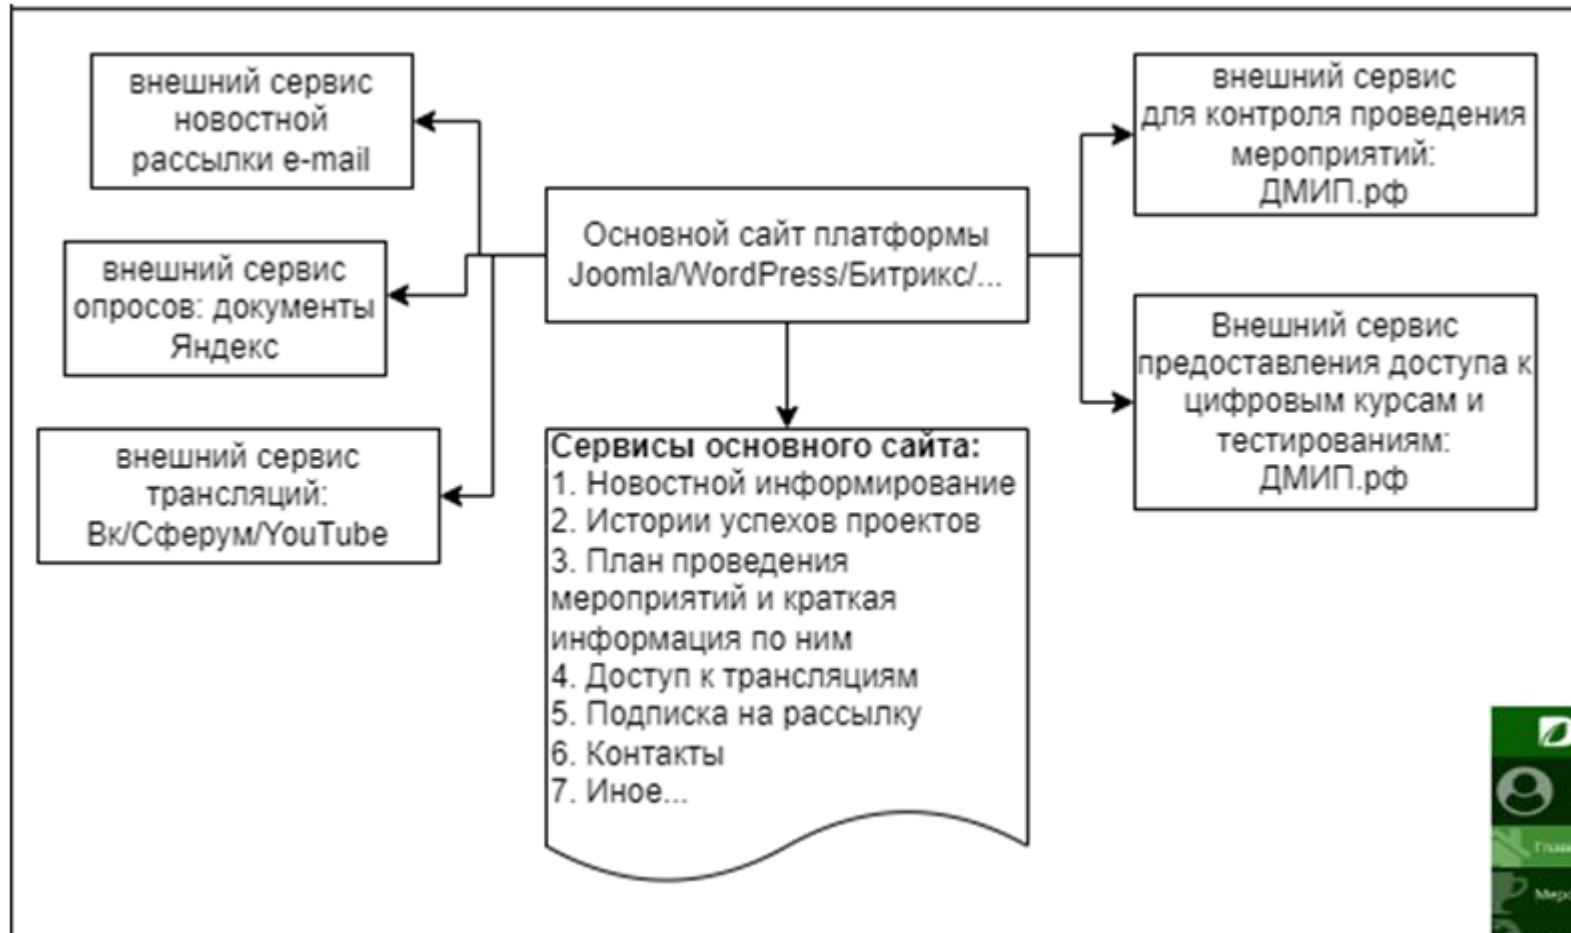



# Концепция Социального Взаимодействия

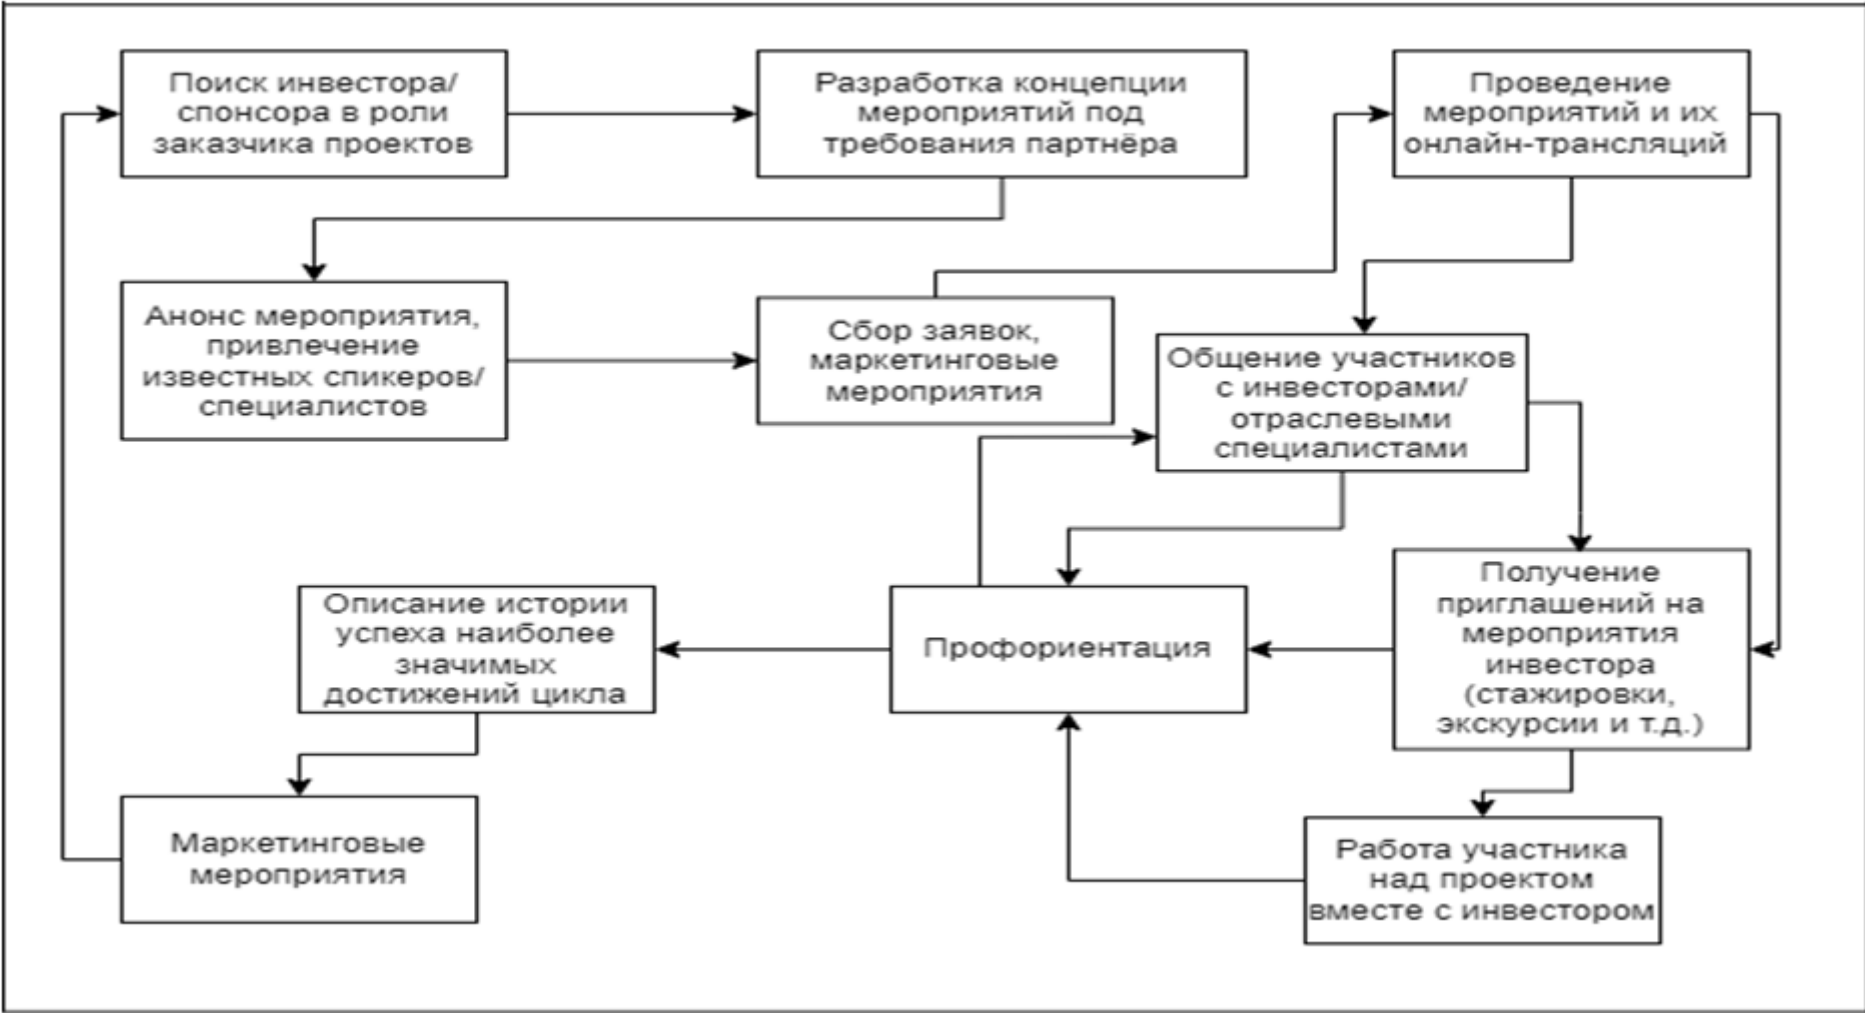



Открыт приём заявок на робо-челендж 3000  
для детей 5-7 классов

komcity.ru

## 25 школ приняли участие в IT марафоне

В марте прошёл долгожданный марафон среди обучающихся пензенских общеобразовательных учреждений. Ребята выполняли 10 заданий, проявляя различные профессиональные компетенции... [Читать далее.](#)

## Актуально

[Робо-челендж 3000](#) (до 20.04.2023)


[Ты – звезда](#) (до 03.05.2023)

[Био-Гик](#) (до 20.05.2023)

## Стейкхолдеры проекта




# Дерево работ

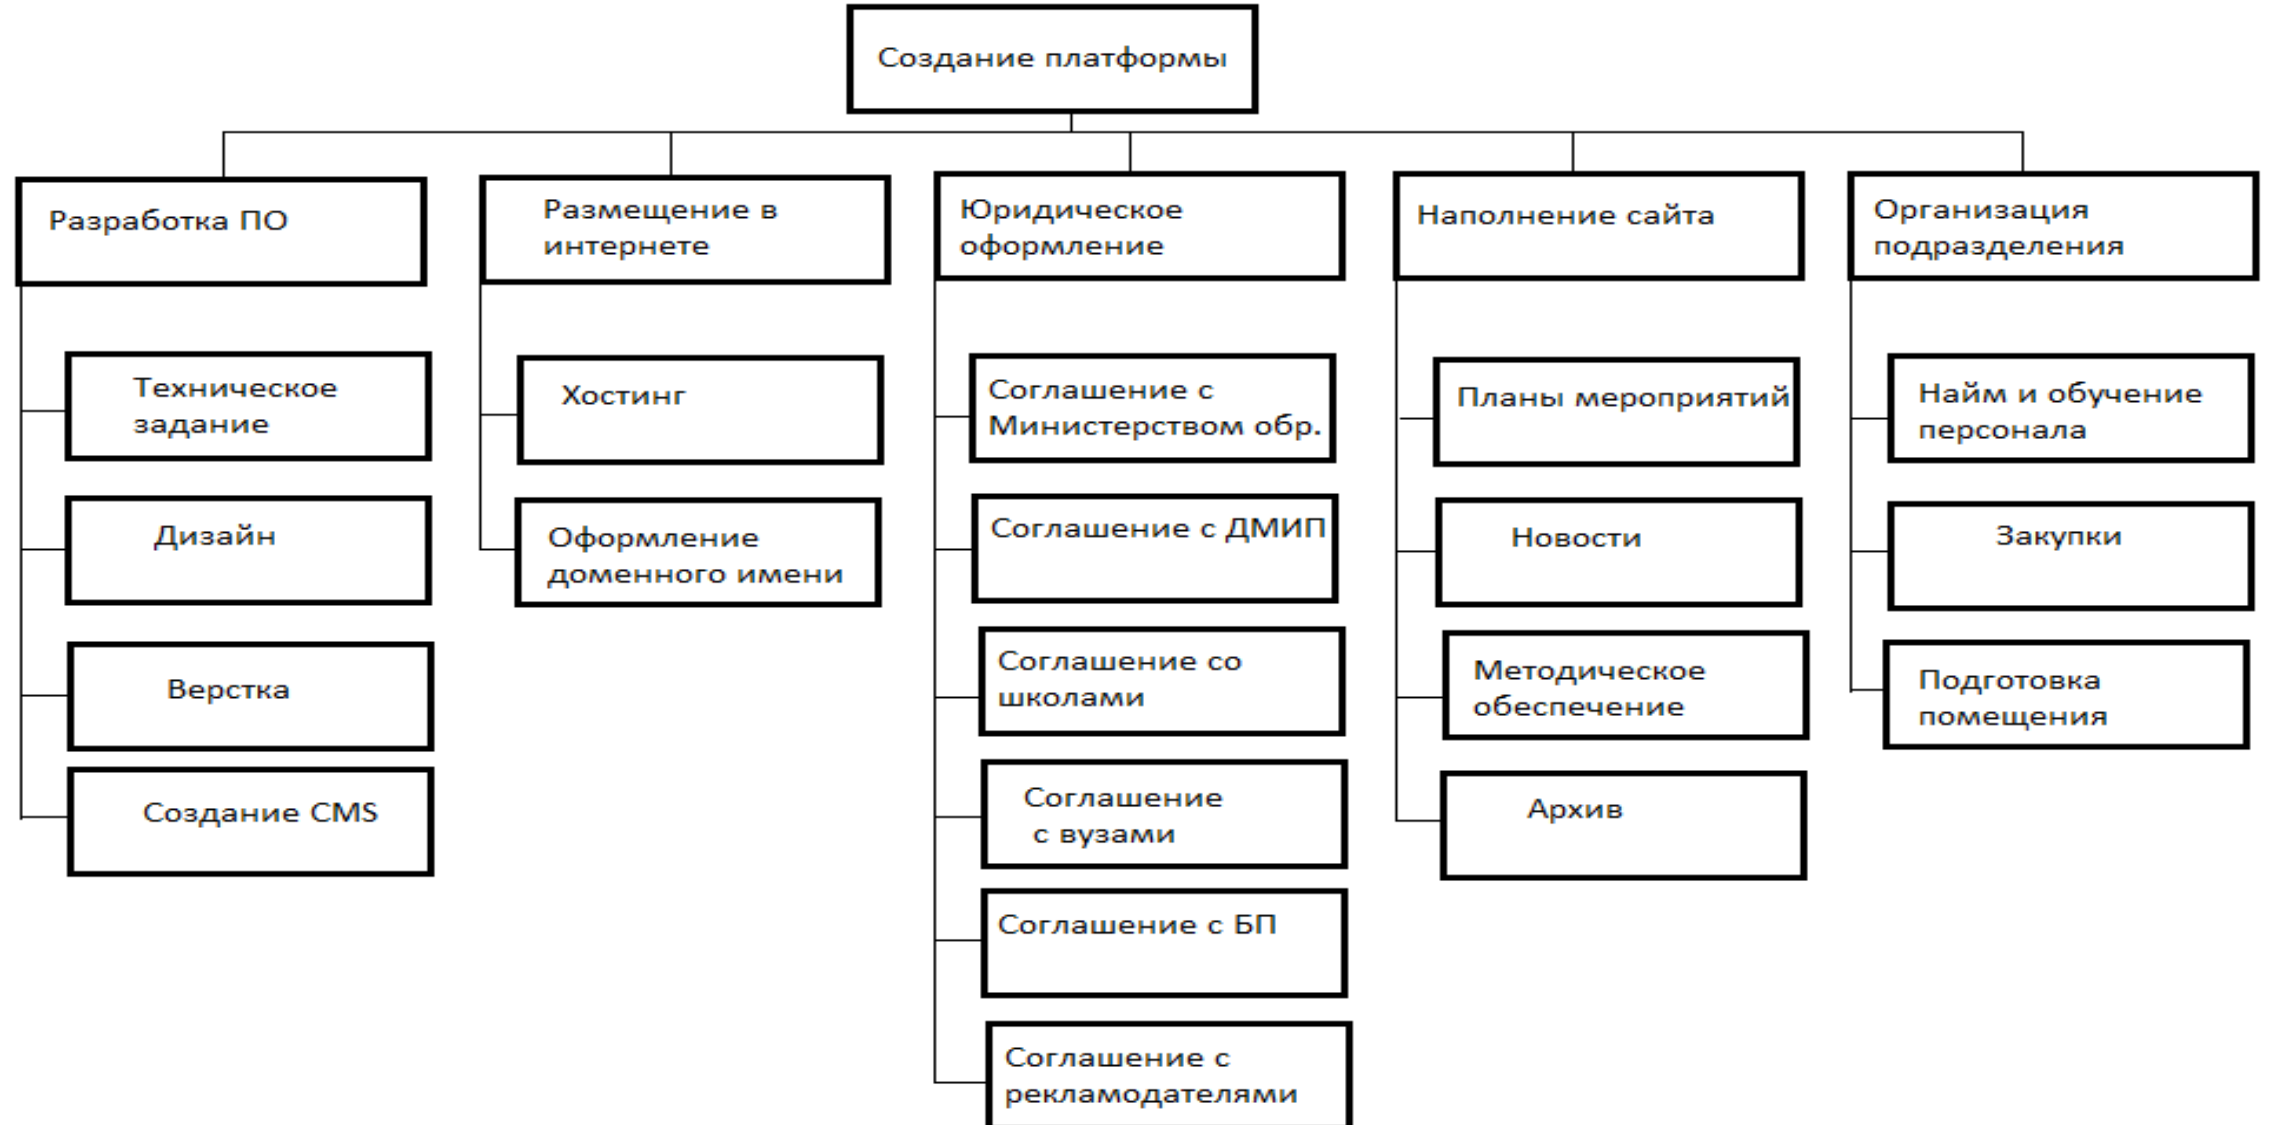

# Матрица ответственности

	®	Название	Краткое название ресу...
1		<b>☐Проект</b>	
2		<b>☐Разработка ПО</b>	
3		ТЗ	Руководитель
4		Дизайн	Дизайнер
5		Верстка	Верстальщик
6		создание CMS	Программист
7		Макет платформы разработан	
8		<b>☐Размещение в интернете</b>	
9		хостинг	Руководитель
10		оформление доменного имени	Руководитель
11		Платформа зарегистрирована в Интернете	
12		<b>☐Юридическое оформление взаимоотношений с участниками</b>	
13		Соглашение с Министерством образования ПО	Руководитель
14		Соглашение с ДМИП	Руководитель
15		Соглашения со школами	Руководитель
16		Соглашение с вузами	Руководитель
17		Соглашения с бизнес-партнерами	Руководитель
18		Соглашение с рекламодателями	Руководитель
19		Договора заключены	
20		<b>☐Наполнение сайта</b>	
21		план мероприятий	Методист
22		новости	Методист
23		методическое обеспечение работы	Методист
24		архив	Специалист
25		Сайт наполнен	
26		<b>☐Организация подразделения</b>	
27		найм и обучение персонала	Руководитель
28		закупки	Специалист
29		подготовка помещения	Руководитель
30		Подразделение создано	

# Сетевой календарный график работы

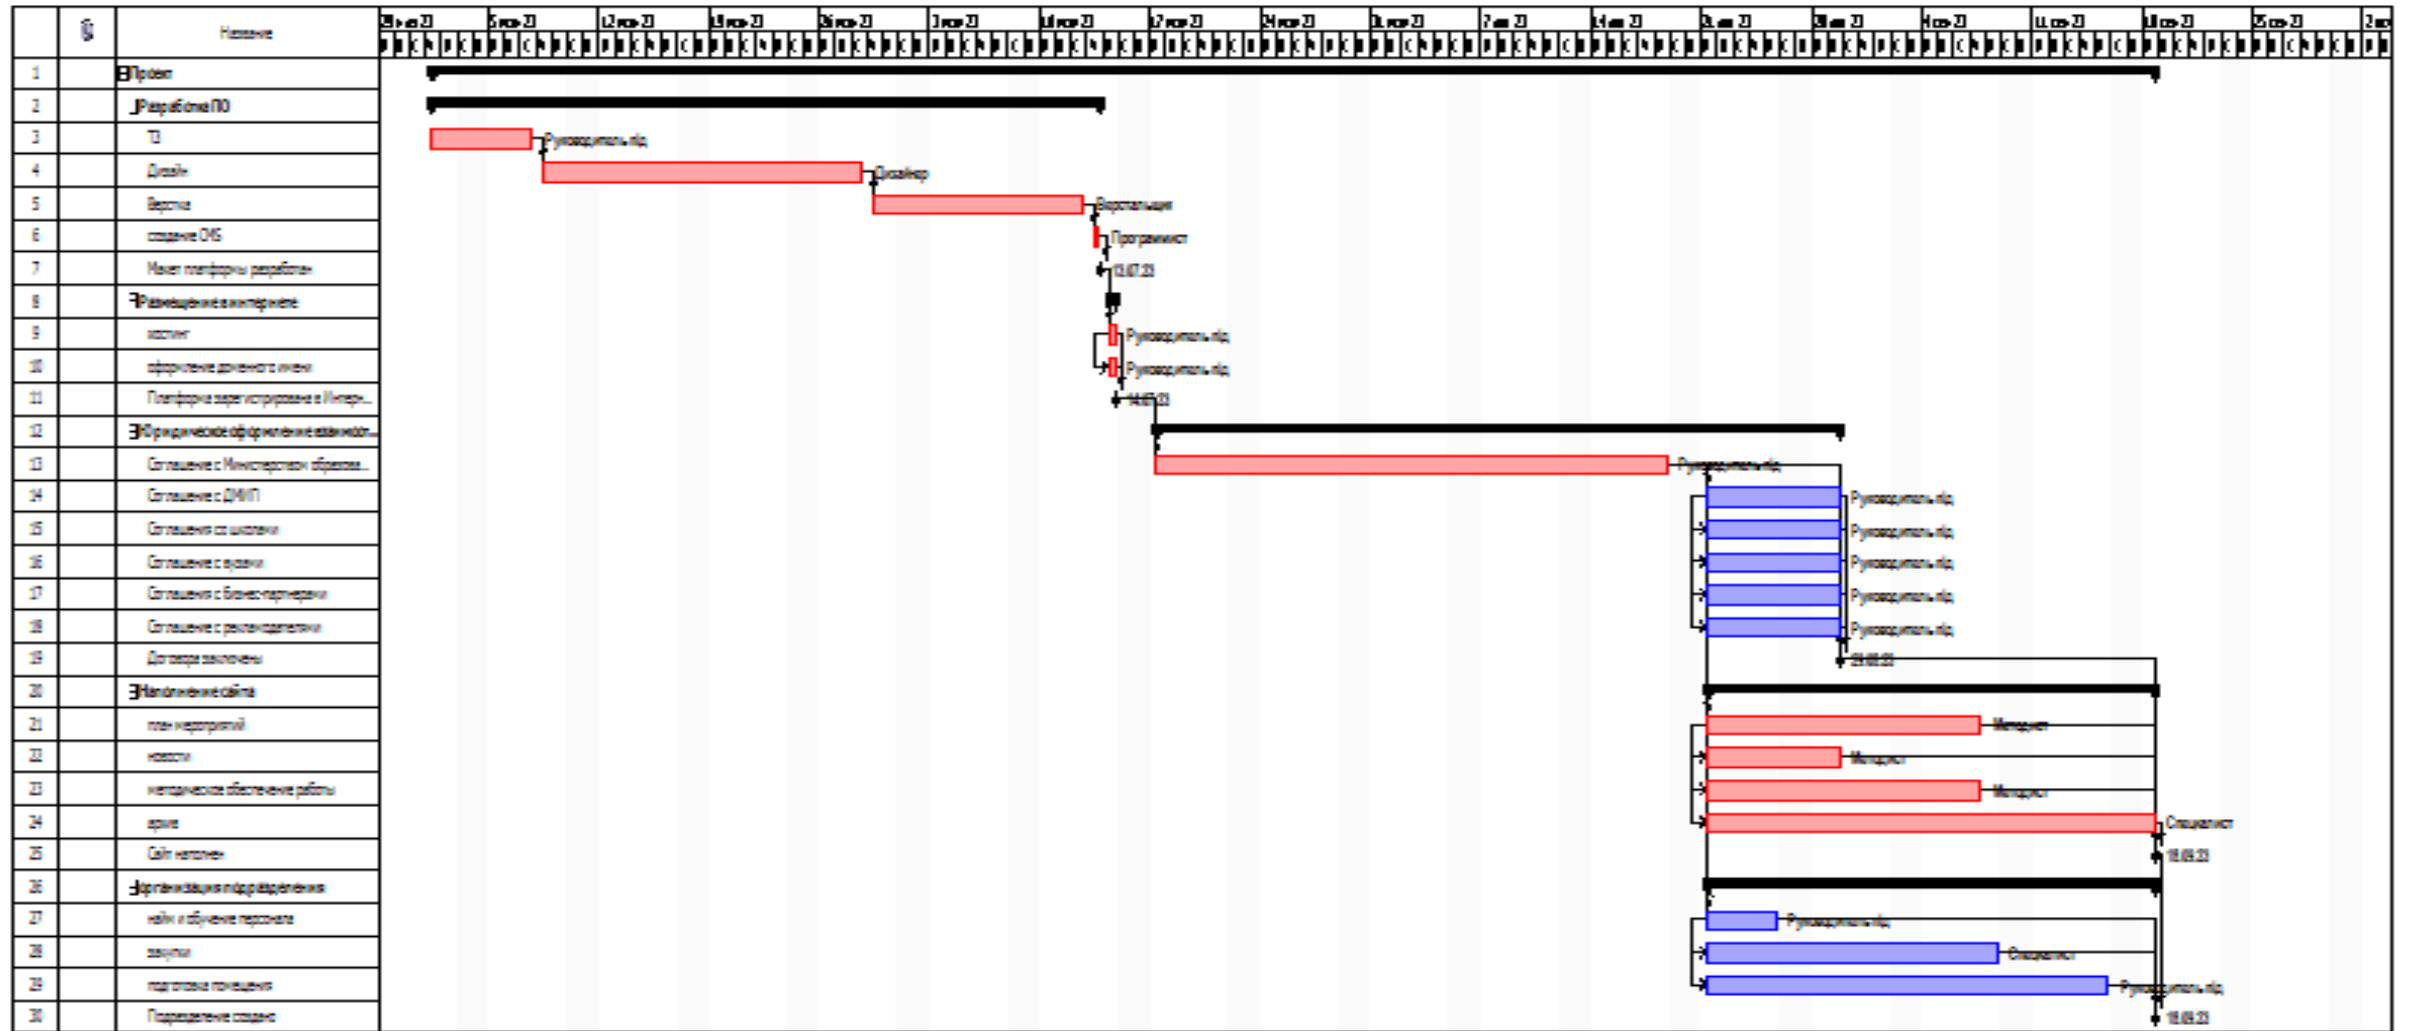



## Риски проекта

№ п.п	Наименование риска	Опасность 10 баллов	Вероятность (0;1)	Важность= опасность x вероятность
1	Финансовые	10	0,6	6
2	Технические	7	0,1	0,7
3	Организационные	5	0,5	0,25
4	Социально-политические	5	0,5	0,25
5	Управленческий	5	0,3	1,5

# Смета проекта

Название	Стоимость
<b>Проект</b>	<b>261840 руб.</b>
<b>Разработка ПО</b>	<b>45440 руб.</b>
ТЗ	8000 руб.
Дизайн	21600 руб.
Верстка	14400 руб.
создание CMS	1440 руб.
Макет платформы разработан	0 руб.
<b>Размещение в интернете</b>	<b>3200 руб.</b>
хостинг	1600 руб.
оформление доменного имени	1600 руб.
Платформа зарегистрирована в Интернете	0 руб.
<b>Юридическое оформление взаимоотношений с участниками</b>	<b>88000 руб.</b>
Соглашение с Министерством образования ПО	32000 руб.
Соглашение с ДМИП	11200 руб.
Соглашения со школами	11200 руб.
Соглашение с вузами	11200 руб.
Соглашения с бизнес-партнерами	11200 руб.
Соглашение с рекламодателями	11200 руб.
Договора заключены	0 руб.
<b>Наполнение сайта</b>	<b>67200 руб.</b>
план мероприятий	16800 руб.
новости	8400 руб.
методическое обеспечение работы	16800 руб.
архив	25200 руб.
Сайт наполнен	0 руб.
<b>организация подразделения</b>	<b>58000 руб.</b>
найм и обучение персонала	8000 руб.
закупки	18000 руб.
подготовка помещения	32000 руб.
Подразделение создано	0 руб.

## создание проектной платформы

Dates			
Start	01.06.23 8:00	Finish	11.09.23 17:00
Baseline Start		Baseline Finish	
Actual Start		Actual Finish	

Duration			
Scheduled	73 дней	Remaining	73 дней
Baseline	0 дней	Actual	0 дней
		Percent Complete	0%

Work			
Scheduled	1 472 часов	Remaining	1 472 часов
Baseline	0 часов	Actual	0 часов

Costs			
Scheduled	261840 руб.	Remaining	261840 руб.
Baseline	0 руб.	Actual	0 руб.
		Variance	0 руб.



**БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!**
